

# 中央水利建设投资统计 月报 (一月)

水利部规划计划司

2013年1月31日

---

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年1月28日统计:

## 一、投资计划下达情况

2012年中央水利建设投资计划已下达到项目单位1522.3亿元,投资计划下达率为97.3%。投资计划尚未全部下达的地区有北京、内蒙古、辽宁、大连、吉林、黑龙江、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、广东、广西、重庆、西藏、青海、宁夏、新疆、兵团。


2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 902.1 亿元、地方配套投资计划 869.5 亿元，投资计划下达率分别为 98.2% 和 102.8%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 277.8 亿元、24.8 亿元、108.6 亿元、491.1 亿元，投资计划下达率分别为 99.2%、99.0%、98.7% 和 97.5%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 620.2 亿元，预算分解下达率为 96.0%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 207.6 亿元、206.1 亿元、183.5 亿元、18.2 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 98.9%、99.1%、90.3%、90.9% 和 100.0%。

## 二、资金到位情况


2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 844.6 亿元、地方配套投资 616.8 亿元，到位率分别为 91.9% 和 72.9%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 159.6 亿元、6.3 亿元、40.8 亿元、410.1 亿元，到位率分别为 105.3%、48.9%、62.4% 和 66.6%。

图1 2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

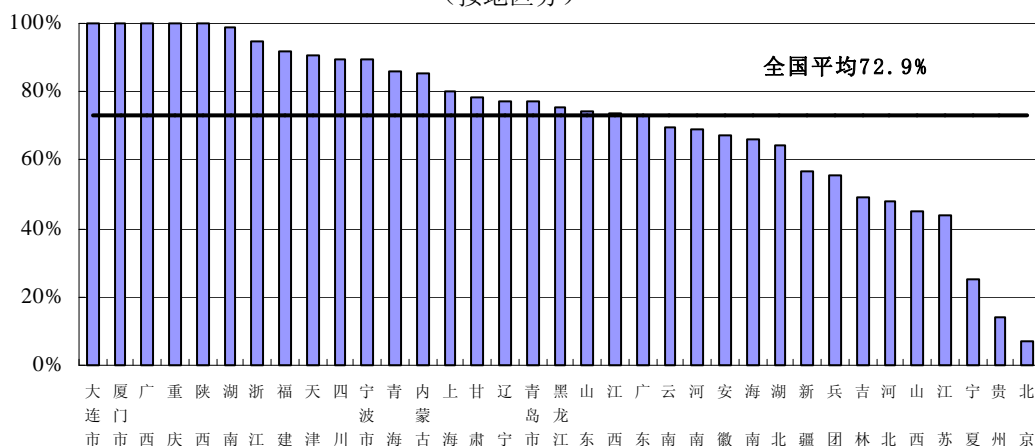

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 597.7 亿元、地方配套资金 289.9 亿元，到位率分别为 92.5%和 84.8% (见图 2)。

图2 2012年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

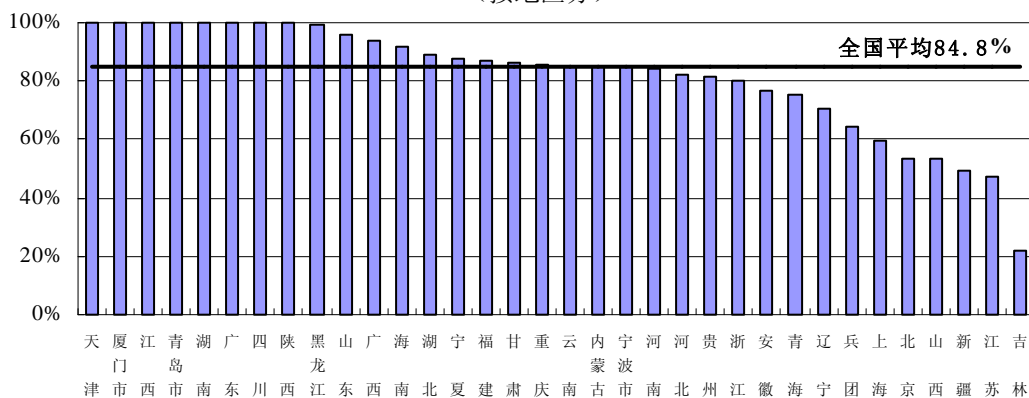


### 三、项目开工情况

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 16712 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6061 个，中央财政水利专项资金 10651 个。共有 14482 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 5180 个，中央财政水利专项资金开工



图4 2012年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

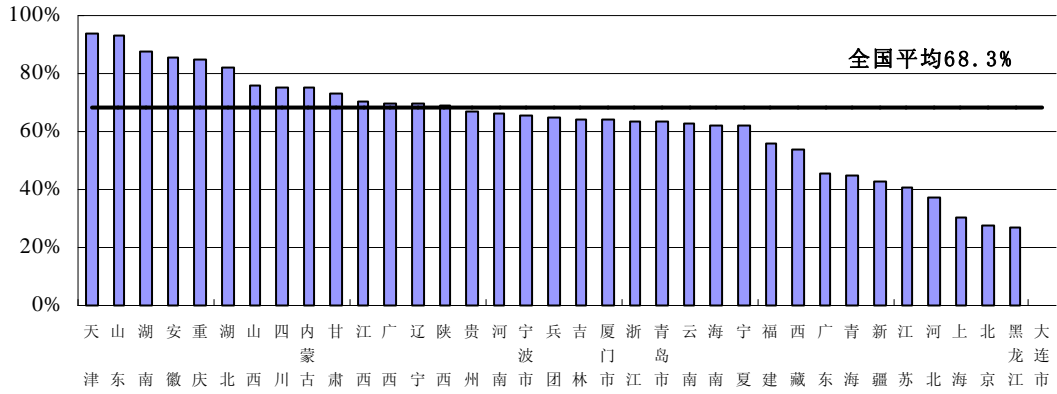

### 五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 14.6 亿立方米，石方 2.5 亿立方米，砼 2428.2 万立方米，金属结构 38.8 万吨。累计新建及加固堤防长度 4926 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 5051 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 10924 公里，累计治理水土流失面积 4037 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
