

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2015-12-10)

2015 年第 47 期

水利部规划计划司

2015 年 12 月 16 日

据统计，截至 2015 年 12 月 10 日，中央水利建设投资完成情况如下：


一、2015 年投资计划完成情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2625.9 亿元，其中，中央投资 1683.3 亿元，地方配套投资 942.6 亿元。各地累计完成年度中央投资计划 2357.6 亿元，投资完成率 90.2%，较 11 月底增加 5.3 个百分点。其中完成中央投资 1502.0 亿元，投资完成率为 89.9%，较 11 月底增加 4.4 个百分点；完成地方配套投资 855.6 亿元，投资完成率为 90.8%，较 11 月底增加 7.1 个百分点。12 月上旬完成 129.6 亿元，其中，完成中央投资 62.5 亿元，完成地方配套投资 67.1 亿元。

年度中央投资计划完成率前 5 位的地区有：天津、浙江、黑龙江、青海和兵团；后 5 位的地区是：**四川、广西、广东、海南和江西**。其中，重大水利工程中央投资计划完成率前 5 位的地区

有天津、河北、海南、湖南、黑龙江；后 5 位的地区是：**湖北、陕西、内蒙古、甘肃和江西。**


图1 2015年年度投资计划完成率
(按地区分)

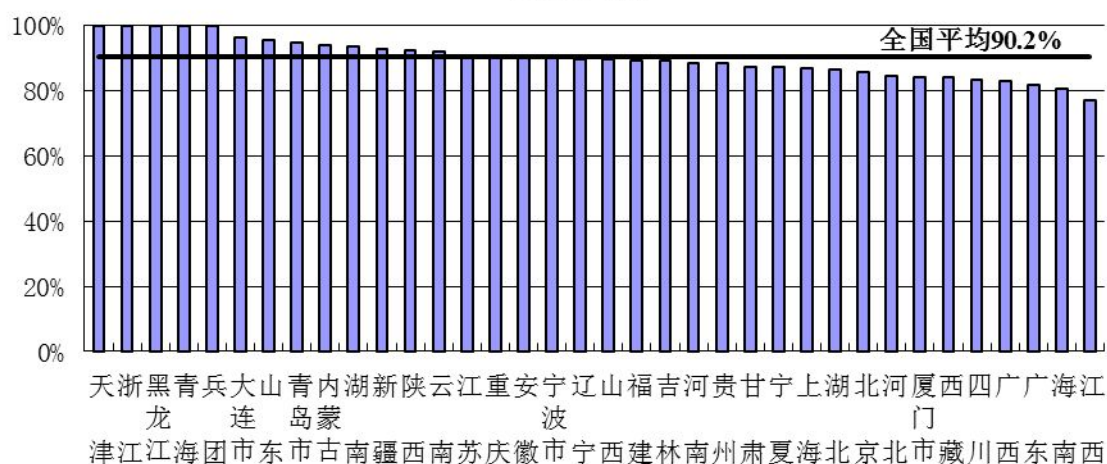

二、中央投资完成情况


截至2015年12月10日,已累计完成2015年中央投资1502.0亿元,完成率89.9%。中央投资完成率较高的地区有黑龙江、大连、江苏、浙江、上海和山东,较低省份有:厦门、河北、陕西、广西和海南。

图2 2015年中央投资完成率
(按地区分)

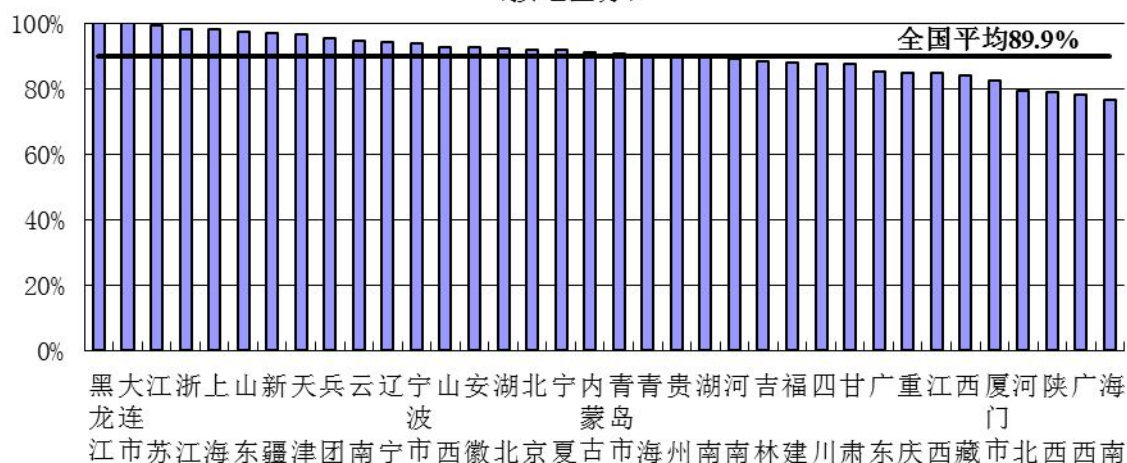

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划1278.3亿元，完成率95.4%。其中，完成中央投资764.5亿元，完成率92.6%；完成地方配套投资513.8亿元，完成率99.9%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为98.5%、88.1%、83.8%、95.3%和87.5%。本旬中央投资完成率增长较快的项目类型是重点水源、水利血防和海堤建设。分地区中央预算内投资完成情况见图3。

图3 2015年中央预算内投资完成率
(按地区分)

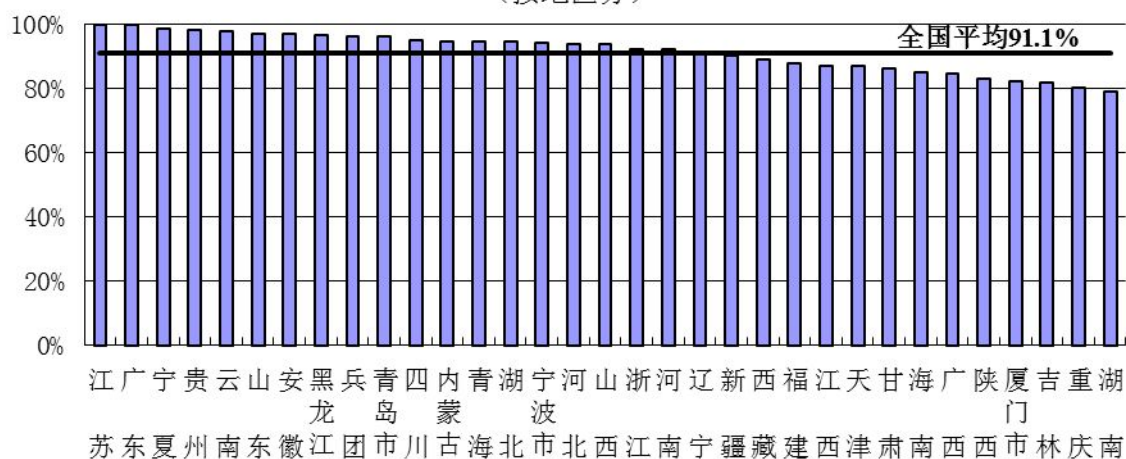

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算1079.4亿元，完成率84.8%。其中，完成中央资金737.6亿元，完成率87.4%；完成地方配套资金341.8亿元，完成率79.8%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、农田水利建设和水土保持专项、山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为84.8%、85.2%、86.2%。本旬中央投资完成率增长较快的项目类型是小型

