

中央水利建设投资统计 月报 (六月)

水利部规划计划司

2012年7月11日

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元；中央财政水利专项资金429.9亿元，主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

截至2012年6月30日，2012年累计安排中央水利投资计划1205.3亿元（不包含山洪灾害41.4亿元），其中中央预算内投资713.6亿元，中央财政水利专项资金491.7亿元。将在今后月报中逐步反映中央水利投资计划落实情况。

截至 2012 年 6 月 30 日统计：

一、投资计划下达情况


2011 年中央预算内水利投资 663.1 亿元，要求地方配套投资 618.1 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 656.7 亿元、地方配套投资计划 596.3 亿元，投资计划下达率分别为 99.0% 和 96.5%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 202.0 亿元、24.97 亿元、62.0 亿元、367.8 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.9%、100% 和 98.3%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 407.5 亿元，预算分解下达率为 94.8%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 113.1 亿元、163.5 亿元、124.4 亿元和 6.6 亿元，预算分解下达率分别为 87.0%、97.3%、99.4% 和 98.6%。

二、资金到位情况


2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 647.6 亿元、地方配套投资 506.3 亿元，到位率分别为 97.7% 和 81.9%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 118.9 亿元、8.7 亿元、31.5 亿元、347.3 亿元，到位率分别为 109.4%、64.8%、75.1% 和 76.5%。

图1 2011年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

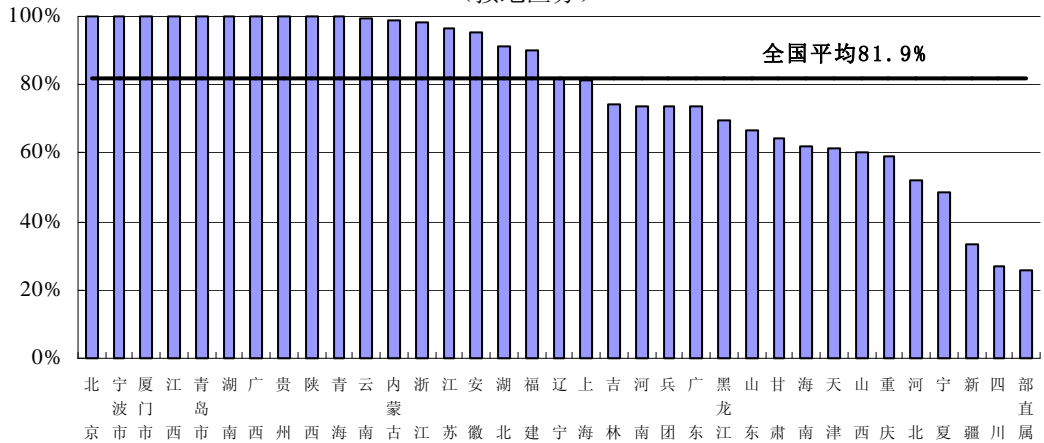

2011年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金401.7亿元、地方配套资金237.3亿元，到位率分别为93.4%和100%（见图2）。

图2 2011年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
(按地区分)

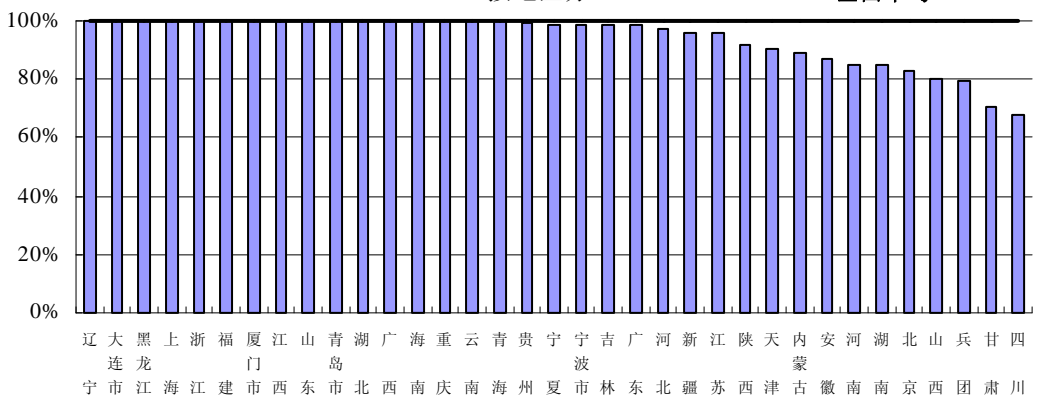

三、前期工作和开工情况


2011年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目10452个，其中中央预算内水利建设投资计划4304个，中央财政水利专项资金6148个。共有8577个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作，其中中央预算内水利投资计划项目3555个，

中央财政水利专项资金项目 5022 个。共有 9698 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 3883 个，中央财政水利专项资金开工 5815 个，开工率分别为 90.2% 和 94.6%。

四、投资完成情况


2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 946.5 亿元，其中中央投资 534.3 亿元、地方配套投资 412.2 亿元，完成率分别为 80.6%（见图 3）和 66.7%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 201.7 亿元、大中型病险水库除险加固工程 12.0 亿元、灌区建设与节水改造工程 50.6 亿元、重大水利工程 270.0 亿元，完成率分别为 99.8%、48.2%、81.7% 和 72.2%。

图3 2011年中央预算内投资中央投资完成率
(按地区分)

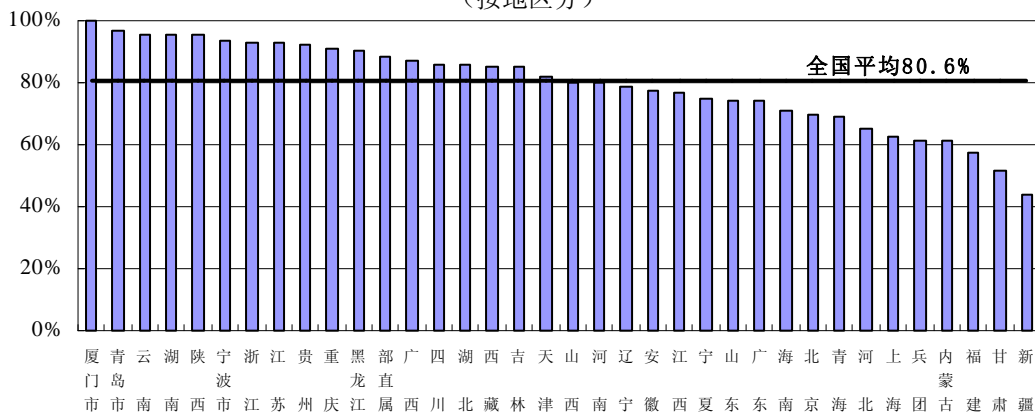

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 548.5 亿元，其中中央资金 348.4 亿元、地方配套资金 200.1 亿元，完成率分别为 81.0%（见图 4）和 85.5%。在完成的中央资金中，中小河流治理 93.5 亿元、小型病险水库除险加固 143.0 亿元、小型农田水利建设 106.4 亿元，完成率分别为 85.1%、85.0% 和 80.9%。

图4 2011年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

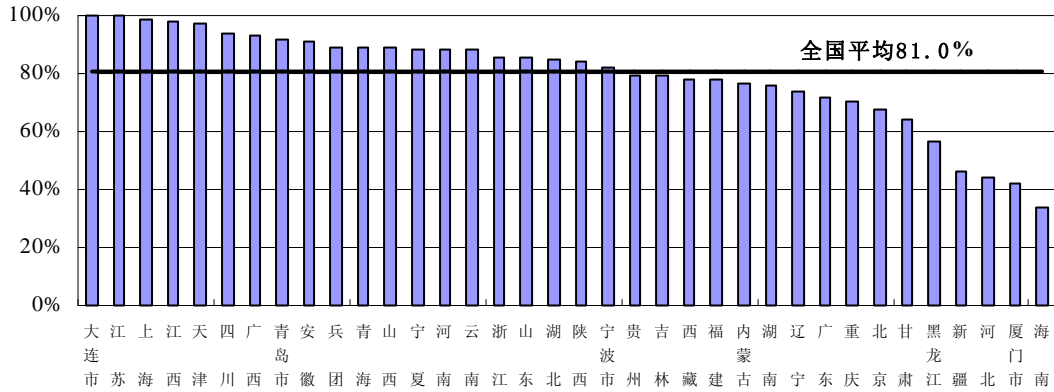

五、工程进展情况

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 123274.0 万立方米,石方 15511.4 万立方米,砼 2115.7 万立方米,金属结构 42.8 万吨。累计新建及加固堤防长度 3933.5 公里,河道清淤疏浚和岸线整治 4149.0 公里,累计新增渠道整治和防渗长度 27303.4 公里,累计治理水土流失面积 886.6 平方公里。

六、数据报送情况

本期月报绝大多数省份按期报送了数据,数据质量较好,但因兵团存在数据错误等问题,引起个别数据调整。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
