

# 中央水利建设投资统计 月报 (六月)

水利部规划计划司

2013年7月4日

---

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年6月30日,2013年累计安排中央水利投资计划680.0亿元,其中中央预算内投资412.9亿元,主要安排农村饮水安全工程225.0亿元、大中型病险水库(闸)除险加固24.7亿、灌区建设与节水改造工程79亿元、重大水利工程84.2亿元;中央财政水利专项资金267.1亿元,主要安排中小河流治理120亿元、小型病险水库除险加固30亿元、小型农田水利建设115.7亿元、水土保持1.4亿元。

截至2013年6月30日统计:2012年中央投资计划完成率

90.3%，与上期相比提高 2%；与去年同期相比提高 9.5%。

## 一、投资计划下达情况

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 918.3 亿元、地方配套投资计划 913.9 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 106.4%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投资计划下达率为 100.0%；重大水利工程中央投资下达 503.3 亿元，投资计划下达率为 99.9%。


2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 645.3 亿元，预算分解下达率为 99.9%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 210 亿元、207.6 亿元、202.9 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 100%、99.8%、99.9%、100.0%和 100.0%。

2013 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资计划 293.6 亿元、地方配套投资计划 127.1 亿元，投资计划下达率分别为 43.2%和 51.7%。其中，中央预算内水利投资 412.9 亿元，已下达到项目单位中央投资计划 158.8 亿元，投资计划下达率 38.5%；中央财政水利专项资金预算 267.1 亿元，已分解下达到项目单位 134.7 亿元，预算分解下达率 50.5%。

## 二、资金到位情况

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 899.7 亿元、地方配套投资 808.1 亿元，到位率分别为 97.9% 和 95.5%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工


图1 2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

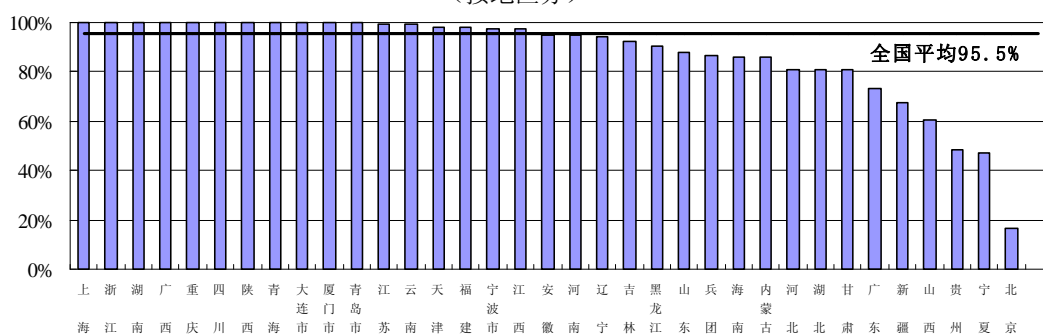

程分别拨付到位地方配套投资 170.7 亿元、9.9 亿元、50.5 亿元、577.1 亿元，到位率分别为 112.6%、76.6%、77.4%和 93.7%。

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 641.1 亿元、地方配套资金 358.1 亿元，到位率分别为 99.3%和 97.6%（见图 2）。

图2 2012年中央财政水利专项投资计划地方  
配套投资拨付率

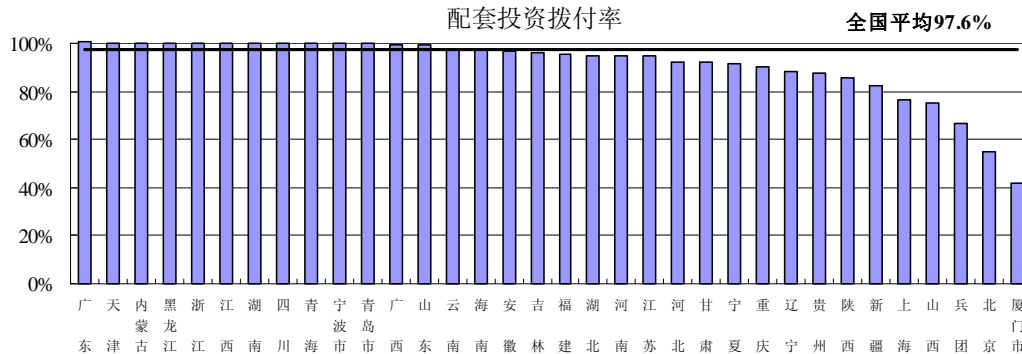

2013 年中央水利建设投资累计拨付到项目单位中央投资 237.0 亿元、投资到位率 34.9%。其中，预算内水利投资计划拨

付项目单位中央投资 121.3 亿元，到位率 29.4%；财政水利专项资金拨付项目单位中央投资 115.7 亿元，到位率 43.3%。

### 三、项目开工情况


2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17083 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6139 个，中央财政水利专项资金 10944 个。共有 16528 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 5881 个，中央财政水利专项资金开工 10647 个，开工率分别为 95.8%和 97.3%。

2013 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 2730 个，其中中央预算内水利建设投资计划 1352 个，中央财政水利专项资金 1378 个。共有 990 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 361 个，中央财政水利专项资金开工 629 个，开工率分别为 26.7%和 45.7%。

### 四、投资完成情况


2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 1531.8 亿元，其中中央投资 808.1 亿元、地方配套投资 723.7 亿元，完成率分别为 88.0%（见图 3）和 85.5%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 276.4 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程 20.7 亿元、灌区建设与节水改造工程 90.6 亿元、重大水利工程 420.4 亿元，完成率分别为 98.7%、82.9%、82.4%和 83.5%。

图3 2012年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

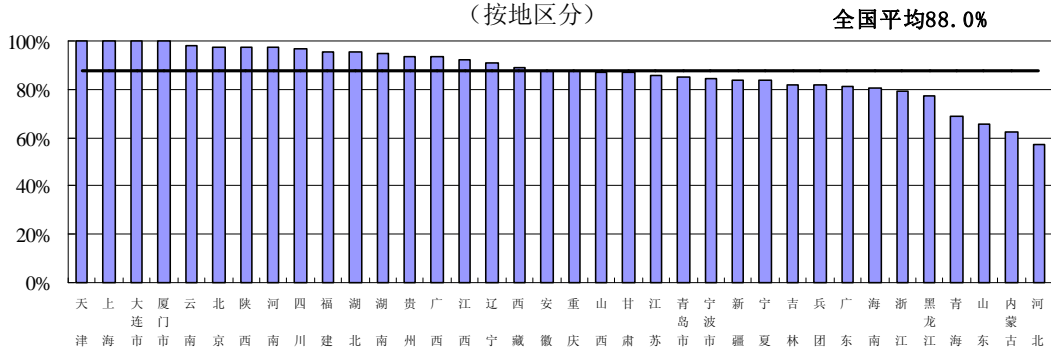

2012年中央财政水利专项资金安排的项目已累计完成投资934.5亿元，其中中央资金604.5亿元、地方配套资金330.0亿元，完成率分别为93.6%（见图4）和89.9%。在完成的中央资金中，中小河流治理196.7亿元、小型病险水库除险加固195.5亿元、小型农田水利建设187.7亿元，完成率分别为93.7%、94.0%和92.4%。

图4 2012年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

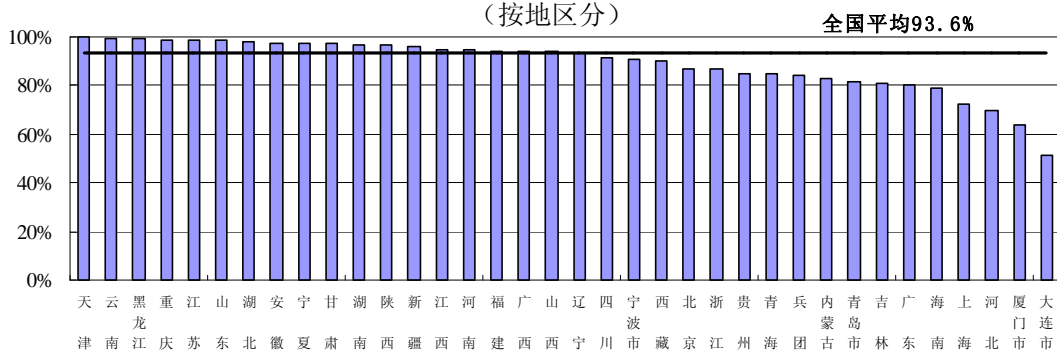

2013年中央水利建设投资累计完成92.6亿元，其中中央资金79.3亿元、地方配套资金13.3亿元，投资完成率分别为11.7%和5.4%。其中，预算内水利投资安排的项目累计完成中央投资51.0亿元，完成率12.0%；财政水利专项资金安排的项目累计完成中央投资28.4亿元，完成率11.0%。

## 五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 25.6 亿立方米，石方 5.3 亿立方米，砼 5322.3 万立方米，金属结构 71.9 万吨。累计新建及加固堤防长度 7874 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 8802 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 17533 公里，累计治理水土流失面积 8030 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
